

INFORMATIEBLAD UITVOERING PROJECT RECONSTRUCTIE VAN DE COULSTERSTRAAT



Aanleiding:

De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Tilburg het project "Reconstructie Van de Coulsterstraat" te Tilburg uitvoeren. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te beperken

Werkzaamheden:

Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit opbrek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden.

Planning & Faseringen

Fase 1: Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Kruisvaardersstraat
Fase 2: Kruisvaardersstraat (Hertogstraat – Van de Coulsterstraat)
Fase 3: Kruisvaardersstraat (Van de Coulsterstraat – Vendeliersstraat)
Fase 4: Van de Coulsterstraat (Kruisvaardersstraat – Slotstraat)
Fase 5A: Burchtstraat (Van de Coulsterstraat – Hertogstraat)
Fase 6: Slotstraat (Van de Coulsterstraat – Vendeliersstraat)
Fase 5B: Burchtstraat (kruising Hertogstraat)
Fase 7: Van de Coulsterstraat (Slotstraat – Tournooistraat)
Fase 8: Van de Coulsterstraat (Tournooistraat – Leenheerstraat)
Fase 9: Tournooistraat (Van de Coulsterstraat – Vendeliersstraat)
Fase 10: Kruisvaarderstraat – speeltuin

Uitvoering

2 maart t/m 6 maart
4 maart t/m 10 april
14 april t/m 29 mei
2 juni t/m 3 juli
6 juli t/m 1 september
2 september t/m 2 oktober
5 oktober t/m 9 oktober
12 oktober t/m 10 november
11 november t/m 11 januari
12 januari t/m 5 februari
8 februari t/m 26 februari

Bovengenoemde perioden zijn slechts een richtlijn en afhankelijk van voortgang werkzaamheden! Afhankelijk van de snelheid in uitvoering, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze perioden en faseringen afwijken. Rechten kunnen hier niet aan ontleend worden. De fasering staat op de achterzijde van dit informatieblad ook geïllustreerd weergegeven.

Communicatie

Projectleider: Bert-Jan Smits
Uitvoerder: Henry Hardlooper
Omgevingsmanager: Joop Willems


Telefoonnummer: 013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar)
E-mailadres: coulsterstraat@vanderzanden.nl

Inzet buurtconciërge: Tijdens de uitvoering zijn wij continue voor u bereikbaar door inzet van onze buurtconciërge. De taken van de buurtconciërge zijn: bewoners / bezoekers / passanten wegwijs maken, containers verplaatsen, vragen beantwoorden, mensen attenderen op veiligheidsaspecten, tijdelijke verkeersmaatregelen controleren en het opruimen van afval en bouwmaterialen rondom de werklocatie.

Bewonersbrieven: U ontvangt gedurende de uitvoering aanvullende bewonersbrieven met uitleg over de werkzaamheden / planning / maatregelen / bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Inloop uur in keet: iedere woensdag tussen 16:00 – 18:00 uur kunt u tijdens het inloopspreekuur ook met uw vragen in onze keet terecht.
Locatie keet: wordt nog bekend gemaakt in bewonersbrief voor aanvang werkzaamheden

Social media: Projectwebsite via www.vanderzanden.nl

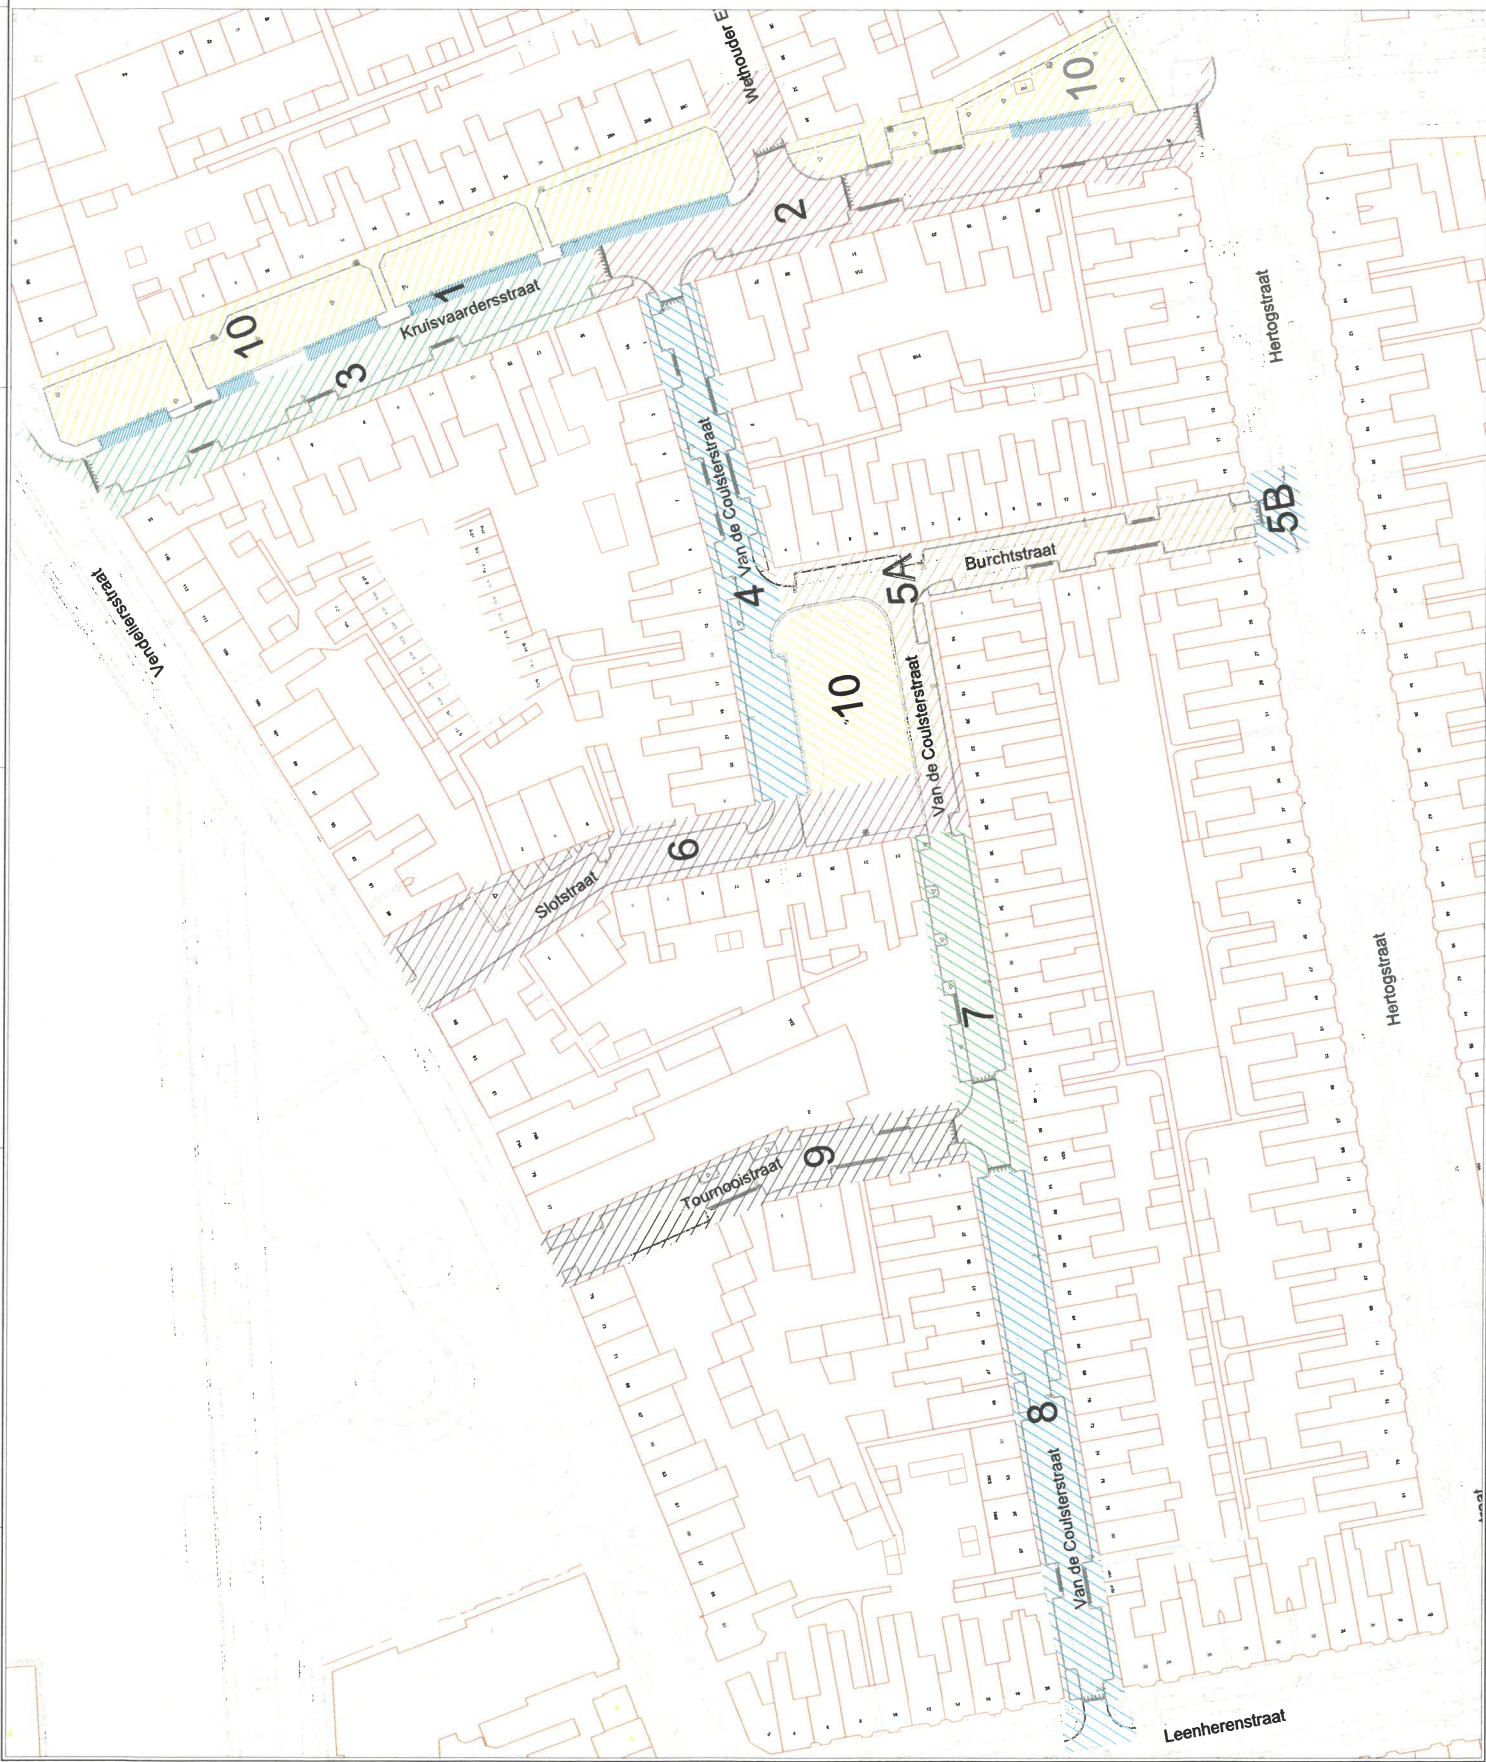

FASERING EN UITVOERINGSDATA

	Fase 1: 2 maart t/m 6 maart
	Fase 2: 4 maart t/m 10 april
	Fase 3: 14 april t/m 29 mei
	Fase 4: 2 juni t/m 3 juli
	Fase 5A: 6 juli t/m 1 september
	Fase 6: 2 september t/m 2 oktober
	Fase 5B: 5 oktober t/m 9 oktober
	Fase 7: 12 oktober t/m 10 november
	Fase 8: 11 november t/m 11 januari
	Fase 9: 12 januari t/m 5 februari
	Fase 10: 8 februari t/m 26 februari



van der Zanden
Van der Zanden Groenland BV
Postbus 200
Postcode 1000 AA Amsterdam
T +31 (0)20 611 33 33
info@vanderzanden.nl
www.vanderzanden.nl

Project: Reconstructie Van de Coulsterstraat Tilburg
Onderdeel: Faseringstekening
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Opdracht: Spoorwiel 811
Datum: 24-01-2020
Formaat: A3
Projectnr.: 217420
Uitvoerder: 1

Naam	Naam	Naam
Ontwerper	Ontwerper	Ontwerper
Controleur	Controleur	Controleur
Beoordelaar	Beoordelaar	Beoordelaar
Goedgekeurd	Goedgekeurd	Goedgekeurd
Datum	Datum	Datum
