


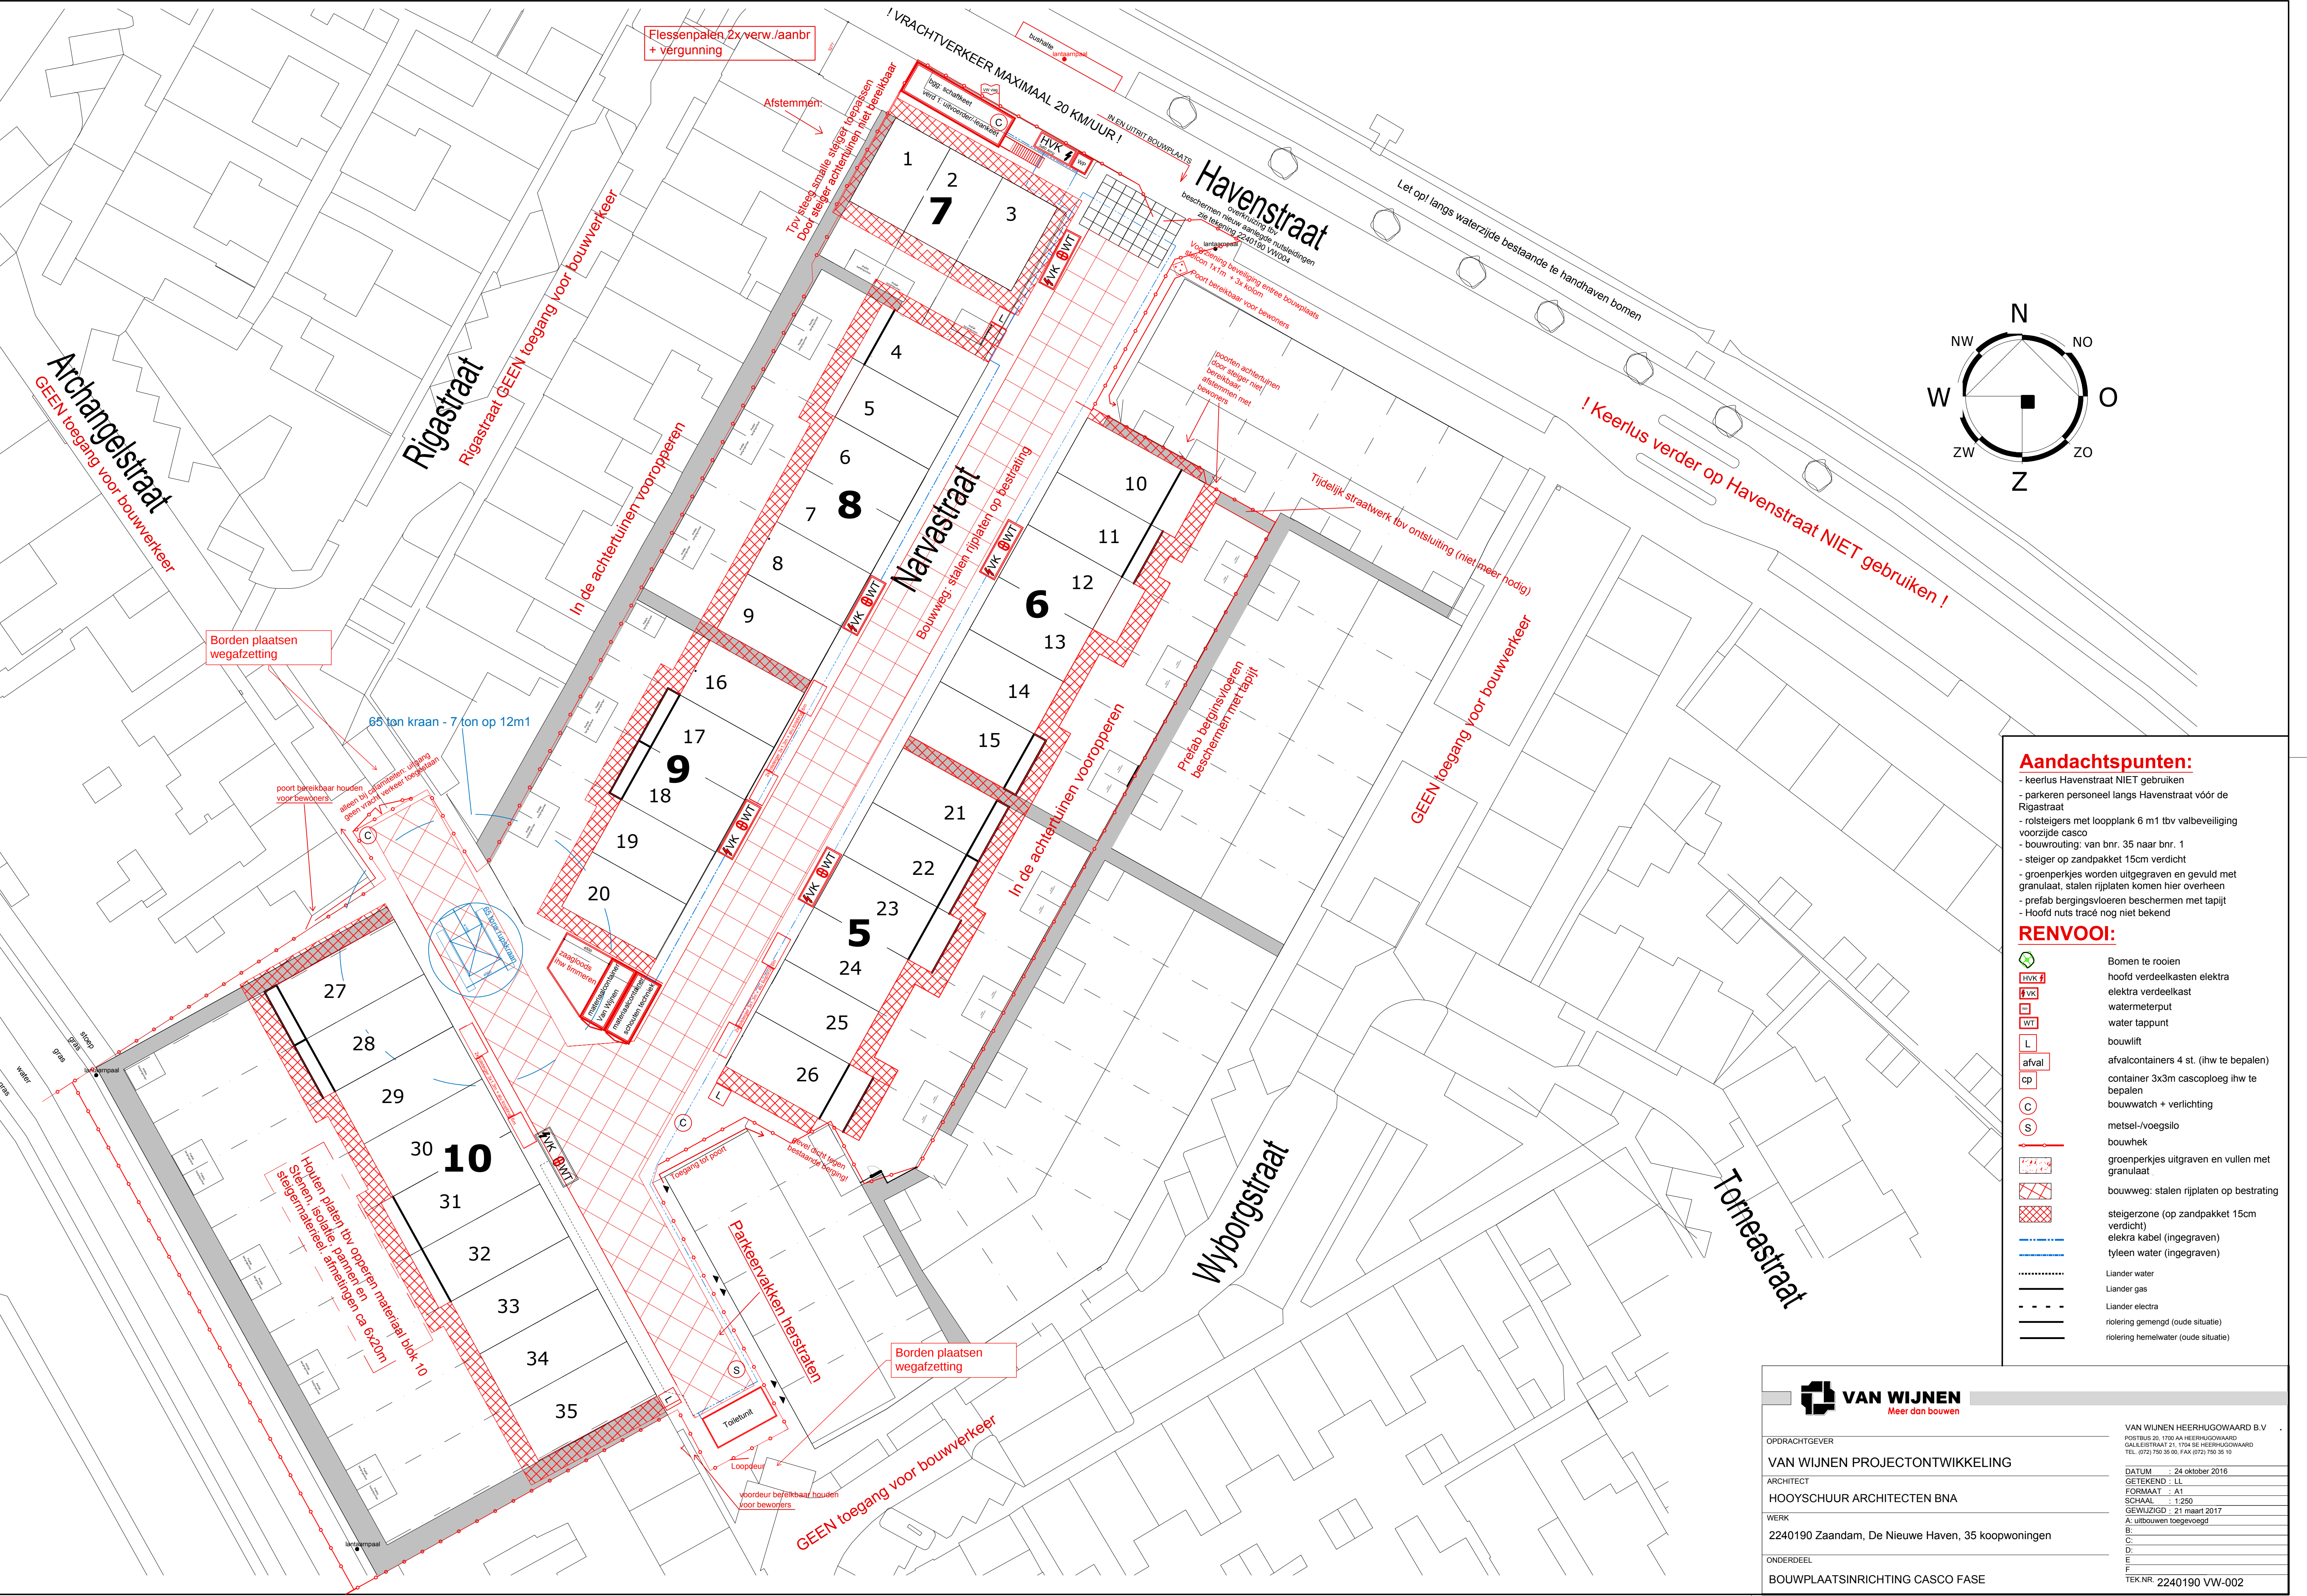

Aandachtspunten:

- keerlus Havenstraat NIET gebruiken
- parkeren personeel langs Havenstraat vóór de Rigasstraat
- rolsteigers met loopplank 6 m1 tbv valbeveiliging voorzijde casco
- bouwruiting: van bnr. 35 naar bnr. 1
- steiger op zandpakket 15cm verdicht
- groenperkjes worden uitgegraven en gevuld met granaulaat, stalen rijnplaten komen hier overheen
- prefab bergingsvloeren beschermen met tapijt
- Hoofd nuts tracé nog niet bekend

RENVOOI:

- Bomen te roeien
- hoofd verdeelkasten elektra
- elektra verdeelkast
- watermeterput
- water tappunt
- bouwlift
- afvalcontainers 4 st. (ihw te bepalen)
- container 3x3m cascoploeg ihw te bepalen
- bouwwatch + verlichting
- metstel-/voegsilo
- bouwhek
- groenperkjes uitgraven en vullen met granaulaat
- bouwweg: stalen rijnplaten op bestrating
- steigerzone (op zandpakket 15cm verdicht)
- elektra kabel (ingegegraven)
- tyleen water (ingegegraven)
- Liander water
- Liander gas
- Liander electra
- riolering gemengd (oude situatie)
- riolering hemelwater (oude situatie)



VAN WIJNEN
Meer dan bouwen

OPDRACHTGEVER

VAN WIJNEN PROJECTONTWIKKELING

ARCHITECT

HOOYSCHUUR ARCHITECTEN BNA

WERK

2240190 Zaandam, De Nieuwe Haven, 35 koopwoningen

ONDERDEEL

BOUWPLAATSIINRICHTING CASCO FASE

VAN WIJNEN HEERHUGOWAARD B.V.

POSTBUS 20, 1700 AA HEERHUGOWAARD
GALLIESTRAAT 21, 1704 SE HEERHUGOWAARD
TEL. 0722 750 90 90 FAX 0722 750 98 19

DATUM : 24 oktober 2016

GETEKEND : LL

FORMAAT : A1

SCHAAL : 1:250

GEWILJIGD : 21 maart 2017

A: uitbouwen toegevoegd

B:

C:

D:

E:

F:

TEK.NR. 2240190 VW-002
