Gemeente Utrecht

Planning

Onderhoud verhardingen Daalseweg

van gelder

Id	Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	1	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 dag	maa 15-8-22	din 16-8-22
2	**2**	**Onderhoud Daalseweg**	**15 dagen**	**maa 29-8-22**	**vri 16-9-22**
3	3	Plaatsen verkeersmaatregelen	1 dag	maa 29-8-22	maa 29-8-22
4	4	Aanbrengen overkluizing	1 dag	maa 29-8-22	maa 29-8-22
5	5	Aanbrengen boombescherming	1 dag	din 30-8-22	din 30-8-22
6	6	Frezen asfalt	1 dag	din 30-8-22	din 30-8-22
7	7	Doorfrezen funderingslaag	2 dagen	woe 31-8-22	don 1-9-22
8	8	Aanbrengen mantelbuis OV	4 dagen	don 1-9-22	din 6-9-22
9	9	Ophogen, verdichten en profileren funderingslaag	3 dagen	maa 5-9-22	woe 7-9-22
10	10	Aanbrengen asfalt (onder-/tussenlaag)	2 dagen	don 8-9-22	vri 9-9-22
11	11	Aanbrengen asfalt deklaag)	1 dag	vri 9-9-22	vri 9-9-22
12	12	Afwerken bermen onder ecologisch toezicht	5 dagen	maa 12-9-22	vri 16-9-22
13	13	Ontrgaven halfverharding inrit	1 dag	maa 12-9-22	maa 12-9-22
14	14	Aanbrengen funderingslaag t.b.v. inrit	1 dag	maa 12-9-22	maa 12-9-22
15	15	Aanbrengen kantopsluiting t.b.v. inrit	1 dag	din 13-9-22	din 13-9-22
16	16	Aanbrengen elementenverhardingen t.b.v. inrit	1 dag	din 13-9-22	din 13-9-22
17	17	Ophogen inritten/wandelpaden halfverhardingen	1 dag	din 13-9-22	din 13-9-22
18	18	Opbreken elementenverhardingen	1 dag	din 13-9-22	din 13-9-22
19	19	Opbreken kantopsluitingen	1 dag	din 13-9-22	din 13-9-22
20	20	Aanpassen hoogteprofiel rijbaan elementenverharding	1 dag	woe 14-9-22	woe 14-9-22
21	21	Opnieuw stellen kantopsluitingen	1 dag	woe 14-9-22	woe 14-9-22
22	22	Aanbrengen elementenverhardingen	1 dag	don 15-9-22	don 15-9-22
23	23	Verwijderen overkluizing	1 dag	vri 16-9-22	vri 16-9-22
24	24	Verwijderen boombescherming	1 dag	vri 16-9-22	vri 16-9-22
25	25	Verwijderen verkeersmaatregelen	1 dag	vri 16-9-22	vri 16-9-22

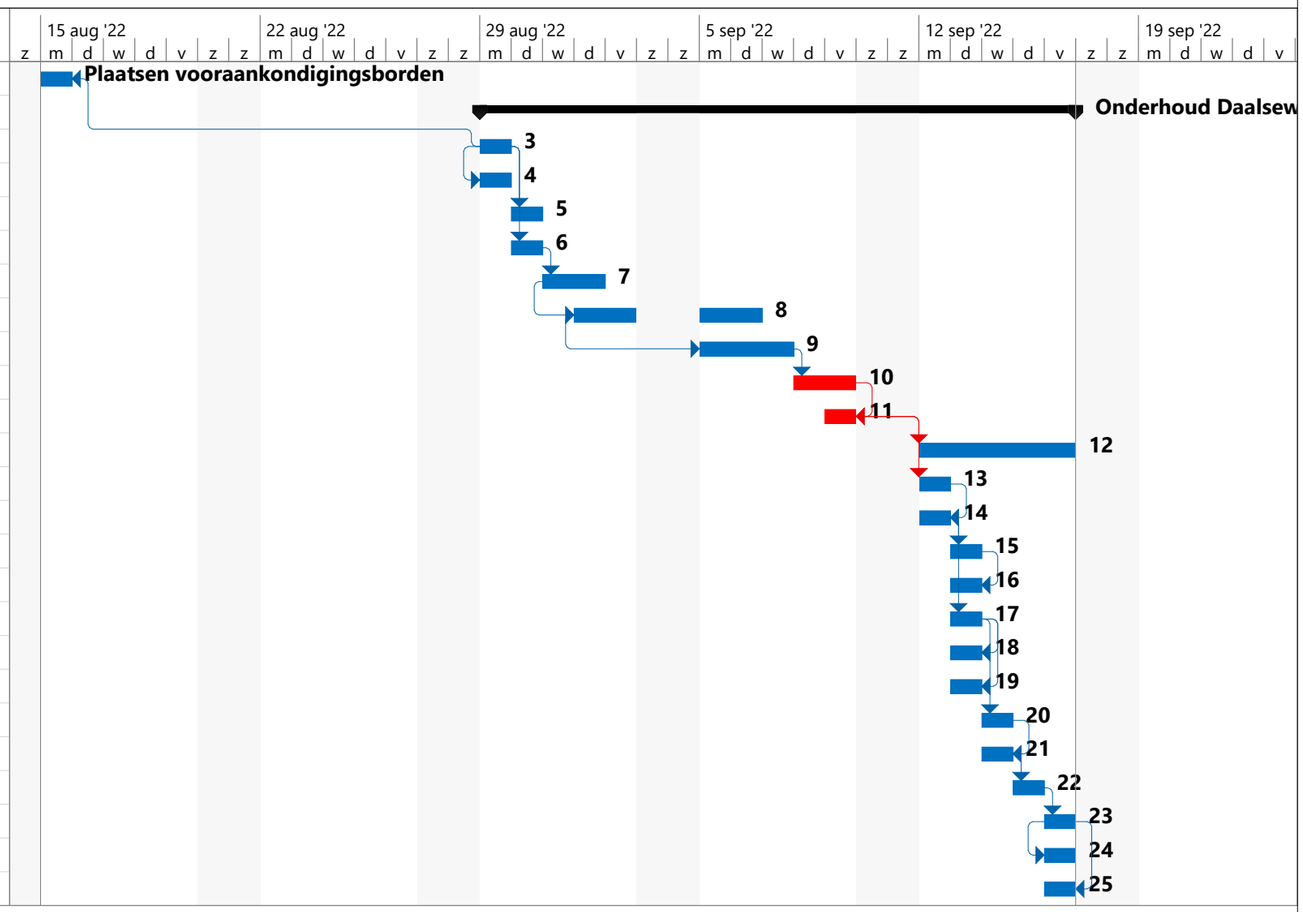

Versie: 1.0
d.d.: 12-07-2022
Definitief

Taak
Splitsing
Mijlpaal
Looptijd project
Fasering
Subfasering
Werkzaamheden asfalt
Inspectie opdrachtgever
Werkzaamheden derden
